FICHE PROJET ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SUR-MESURE

Chaque projet faisant appel à une fabrication sur-mesure, aucun devis ne pourra être établi si une information est manquante.
La conception du complexe d'étanchéité est sous la responsabilité du maitre d'œuvre, base à partir de laquelle Flexirub fournit une étude de(s) membrane(s) d'étanchéité et de ses accessoires.
La prise de côtes indispensable à l'établissement des plans et du devis est sous l'entière responsabilité du client.
Merci de nous retourner cette fiche projet dûment complétée. Délai de traitement 96h.

A. INFORMATIONS DEMANDEUR :

SOCIETE : **INTERLOCUTEUR :**

ACTIVITE : --- **TELEPHONE INTERLOCUTEUR :**

CP VILLE : **E-MAIL :**

B. INFORMATIONS CHANTIER :

STADE DU PROJET : Étude : ◯ Projet ferme : ◯ **Date du chantier :**

TYPE DE TRAVAUX : Neuf : ◯ Rénovation : ◯

RÉFÉRENCE DU CHANTIER :

Adresse : Code postal : Ville :

NOM DE L'INSTALLATEUR/POSEUR :

Adresse : Code postal : Ville : Tél :

DESTINATION DE LA TOITURE ET PROTECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ :

Inaccessible :

Auto-protégé* (EPDM seul) : ◯

Auto-protégé* (Gazon synthétique) : ◯

Graviers (Ép. suivant DTU=5 cm) : ◯

Végétalisation : Bac précultivé : ◯ Couche de culture (Substrat) : ◯ Préciser épaisseur (cm) :

Accessible :

Dalles sur plots : ◯

Chape (carrelage) : ◯

Dalles en béton préfa ou pierres naturelles : ◯

Hors avis technique si S>50m² (support bois) ou S>20m² (support béton).
Le système Isoweld® peut être utilisé lorsque le lestage est impossible et collage non préconisé. Prendre contact avec un de nos techniciens.

C. STRUCTURE :

ÉLÉMENT PORTEUR :

Bois et panneaux à base de bois : OSB : ◯ CTBH : ◯ CTBX : ◯ Bois Massif : ◯

Béton coulé en place : Béton cellulaire : ◯ Maçonnerie : ◯

Tôles Aciers Nervurées (TAN)/Bacs aciers : ◯

Si ancienne étanchéité : Bitume : ◯ PVC/TPO : ◯ Autre (préciser) :

NATURE DES ACROTÈRES :

Identique à l'élément porteur : ☐

Sinon préciser la nature :

Vérifier si nécessité de mise en œuvre costières métalliques

D. ISOLANT :

TOITURE FROIDE (Isolation par l'intérieur) : Oui : ☐

TOITURE CHAUDE** (Isolation par l'extérieur) : Oui (nécessite un pare-vapeur entre isolant et élément porteur) : ☐

ISOLATION SOUS L'ÉTANCHÉITÉ :

Polyuréthane PUR avec revêtement : Alu : ◯ Papier : ◯ Autre *(préciser)* : ◯

Polyisocyanurate PIR avec revêtement : Alu : ◯ Papier : ◯ Autre *(préciser)* : ◯

Laine minérale MW avec revêtement : Nu : ◯ Surfacé Bitume : ◯

Polystyrène expansé EPS : ◯

Autre matériau isolant *(préciser)* : ◯

ISOLATION SUR L'ÉTANCHÉITÉ (POSE INVERSÉE) : Polystyrène extrudé XPS : ☐

ÉPAISSEUR TOTALE DE(S) L'ISOLANT(S) PAR l'EXTERIEUR (cm) :

***Dans le cas d'un mix toiture chaude/froide, il est impératif de respecter la règle 2/3 (ext) 1/3 (int), en considérant la Résistance Thermique Totale*

E. MEMBRANE D'ETANCHÉITÉ :

ÉPAISSEUR DE LA MEMBRANE : EPDM 1,20 mm*** : ◯ EPDM 1,50 mm*** : ◯ EPDM 2,00 mm : ◯

****épaisseur de membrane EPDM sous Avis Technique n ° 5.2 19-2664_V1*

MODE DE FIXATION DE LA MEMBRANE :

En indépendance, pose libre : ◯	En adhérence totale, pose par collage : ◯	En fixation mécanique Isoweld : ◯
Structure de protection obligatoire (lestage par-dessus la membrane) > 50 kg/m²	*Si le support d'étanchéité est l'isolant, il doit être fixé mécaniquement. Compatibilité colle/isolant à vérifier par le client. Flexirub ne préconise pas le collage sur isolant*	*Se reporter à la fiche de projet dédiée*

Date MAJ : Juillet 2023

3 rue du Châtelet - Parc d'activités Le Châtelet - 35310 Saint-Thurial (France)
Tél : +33 (0)2 99 85 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 85 41 42
Email : info@flexirub.com

FICHE PROJET ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SUR-MESURE


F. PLANS :

Afin de réaliser l'étude de votre dossier, merci de nous faire parvenir avec cette fiche vos plans au format .dwg, .dxf, .skp ou .pdf avec les cotes périphériques et diagonales *. Des photos et vues 3D seraient souhaitables.

→ Sans ces éléments, aucun devis ne pourra être réalisé.

Pour un projet simple, les tableaux ci-dessous peuvent être complétés.


Côtes périphériques (cm)	AB	BC	CD	DA
Côtes diagonales (cm)	**AC**		**BD**	



DIMENSIONS DES RELEVES (Minimum réalisable = 5 cm sachant que minimum conforme au DTU = 15 cm) :


Important :
- **Si toiture chaude :** déduire épaisseur isolant(s) du relevé
- **Si des angles orientés vers le bas « retombée » :** Précisez avec *(ex : A*)
- **Si relevé sur mur avec solin :** ancrage et retombée = 0
- **Si pente :** préciser les différentes hauteurs à chaque angle

Angles (cm)	A	B	C	D
Relevé				
Ancrage				
Retombée				

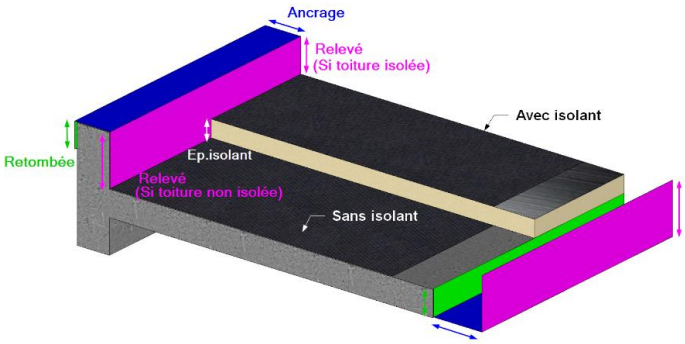


DIMENSIONS EN CAS D'OUVERTURE(S) :

Dim. Ouverture (cm)	ab	bc	cd	da
Côtes diagonales (cm)	**Aa**	**Bb**	**Cc**	**Dd**
Angles Ouverture (cm)	a	b	c	d
Relevé				
Ancrage				

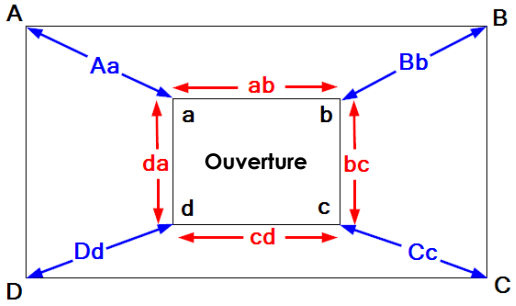

G. ACCESSOIRES :

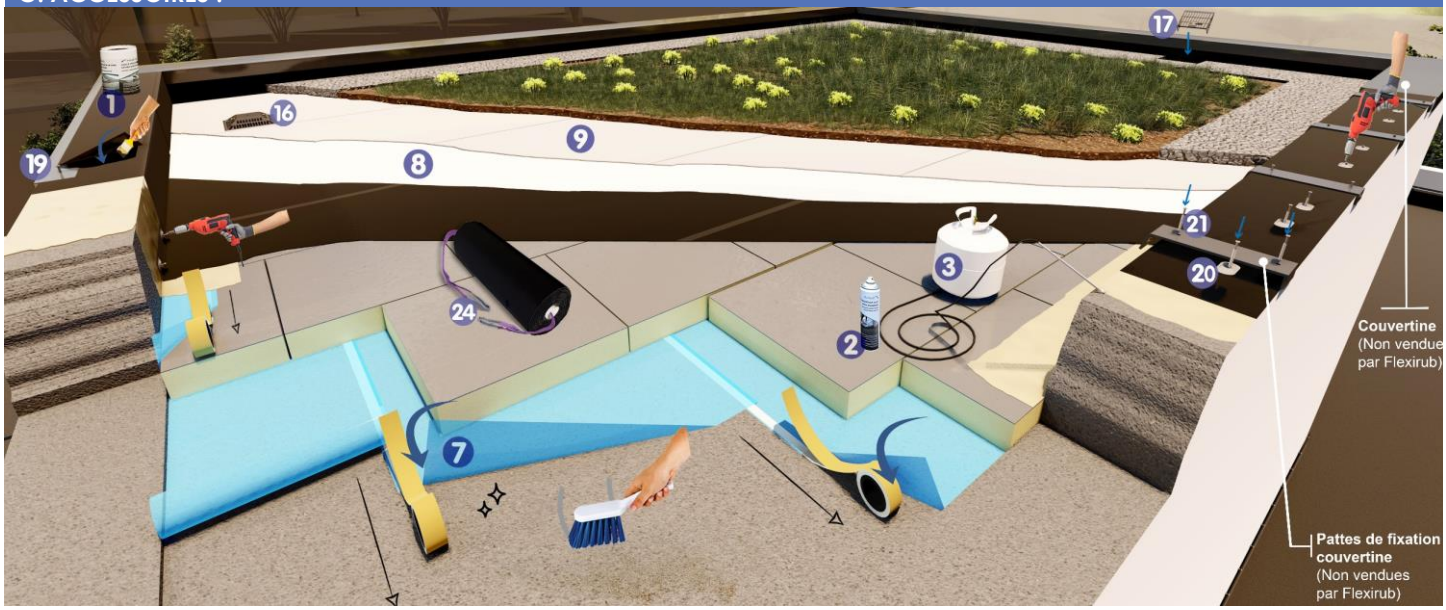

3 rue du Châtelet - Parc d'activités Le Châtelet - 35310 Saint-Thurial (France)
Tél : +33 (0)2 99 85 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 85 41 42
Email : info@flexirub.com

Date MAJ : Juillet 2023

FICHE PROJET ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SUR-MESURE



Repère	Désignation	Dimensions (Merci de compléter vos quantités)
1	Colle pour membrane EPDM sur EPDM	Pot 1 L :
2 & 3	Colle pulvérisable pour membrane EPDM sur tout support	2 Spray 750 ml : — 3 Bombonne 22 L :
4 & 5	Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton	4 Pot 2 L : — 5 Seau 8 L :
6	Mastic de finition pour membrane EPDM	Cartouche 280 ml :
7	Film pare-vapeur toiture 300µm (et son adhésif double face)	Rouleau 2 x 25 m : — Adhésif double face :
8	Géotextile de protection 300g/m²	Au rouleau : 1 x 25 m : — 1 x 50 m : — 2 x 50 m : 3 x 50 m : — 6 x 50 m : 2D Sur mesure : ☐
9	Grille de drainage toiture 550g/m2 (en cas de végétalisation)	Rouleau 1,2 x 40 m :
10	Angle de renfort interne EPDM 1,00mm	15 x 15 x 15 cm :
11	Angle de renfort externe EPDM 1,00mm	30 x 30 x 15 cm :
12	Collerette souple EPDM 1,00mm (Ht fixe 300mm, Ømm variable)	Ø 100 mm : — Ø 125 mm : — Ø 160 mm : Ø 200 mm : — Ø 230 mm : Sur-mesure, Qté : — Ø (mm) : — Ht (mm) :
13	Descentes EP traditionnelle ALU (mise en œuvre chantier)	Ø 65 mm : — Ø75mm : — Ø95mm : L.tube 500 mm : — L.tube 600 mm :
14	Descente EP intégrée* ALU + Embase EPDM (*à valider selon contexte)	Ø 65 mm : — Ø 75 mm : — Ø 95 mm : L.tube 200 mm : — L.tube 500 mm :
15	Crapaudine extensible ALU	Ø 80 à 100 mm : — Ø110 à 130mm :
16 & 17	Crapaudine pare-graviers GALVA	200 x 200 mm :
18	Profilé solin	96 mm x 2 m :
19	Profilé rive	125 mm x 2 m :
20	Platines de fixation 82 mm x 40 mm x Ø 7,5 mm	Sachet de 50 : — Sachet de 100 :
21	Vis béton (pré-perçage nécessaire, torx T25)	Ø 6,3 mm x 50 mm : Boite de 500 : — Sachet de 100 :
22	Vis bois/bac acier (autoforante, torx T25)	Ø 4,8mm x 50mm : Boite de 1000 : — Sachet de 100 : Ø 4,8mm x 80mm : Boite de 500 :
23	Bande EPDM pour fixation mécanique pied de relevé	EPDM 1,20 mm, 90 cm x 5 cm, espacement 2 m : ☐
24	Elingue à usage unique (CMU max)	500 kg : — 1000 kg : — 1500 kg :
25	Kit de réparation et de finition	Carton :
26	Kit outils de pose Toiture	Carton :

Date MAJ : Juillet 2023

3 rue du Châtelet - Parc d'activités Le Châtelet - 35310 Saint-Thurial (France)
Tél : +33 (0)2 99 85 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 85 41 42
Email : info@flexirub.com
